




Relatório Mensal Execução de obras e serviços

MÊS: JUNHO
ANO: 2023

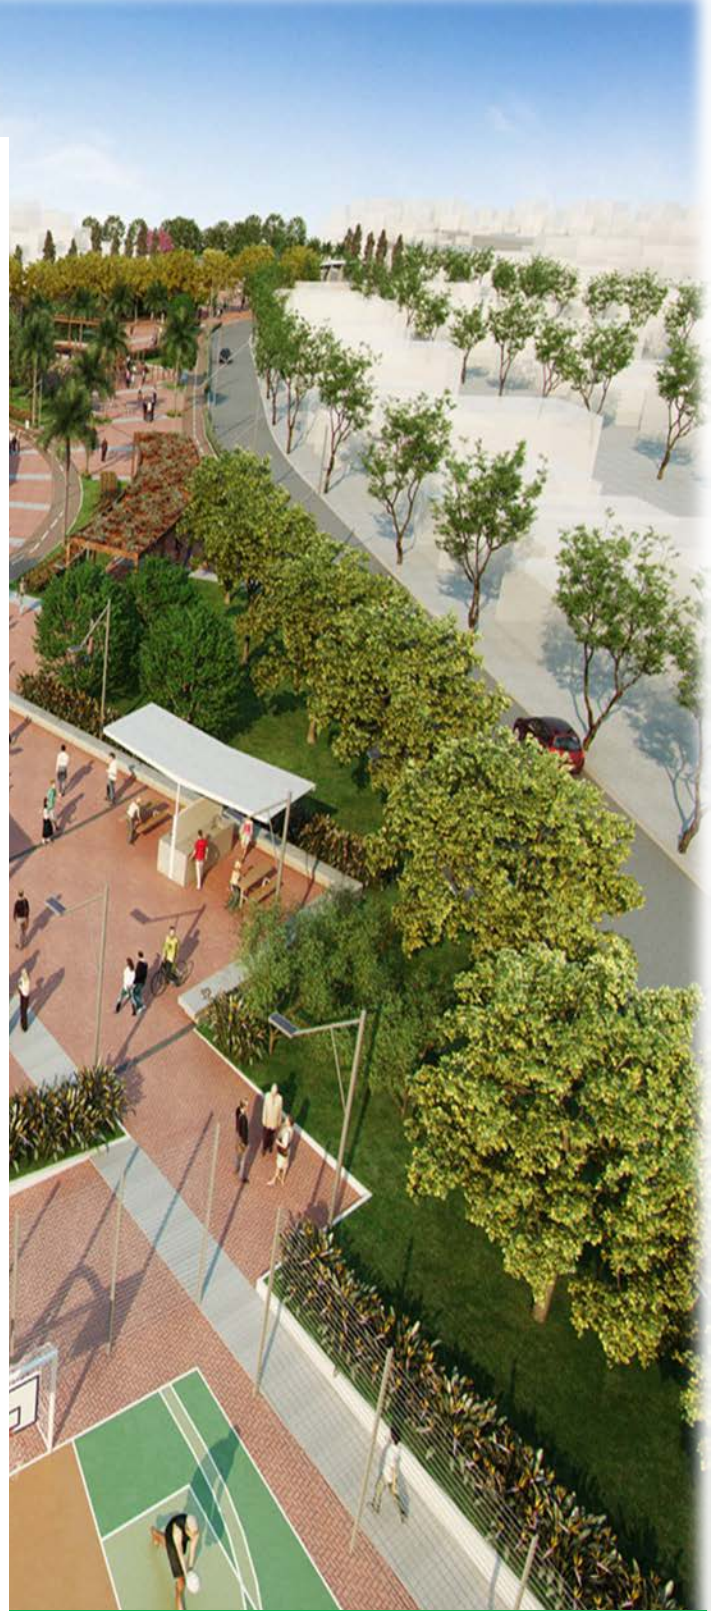

Número de convênio: 005/2022

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

Nome do contratado: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ do contratado: 36.908.164/0001-69

Local da Execução da obra: Rua Nossa Senhora Aparecida S/N

Origem do Recurso: SEPLAD

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 005/2022

Data início da obra: 03/03/2022

Data final da obra: 27/06/2024

Valor total da Obra: R\$ 588.585,50

Valor total aplicado: R\$ 206.803,31

Valor a desembolsar: R\$ 381.782,19

Percentual total aplicado: 35,14%

Percentual mensal aplicado: 06,15%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 36.215,83

Número de convênio: 112/2022

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Nome do contratado: SOLLOS CONSTRUTORA LTDA – EPP

CNPJ do contratado: 01.733.027/0001-56

Local da Execução da obra: Travessa Antônio Gomes s/n

Origem do Recurso: SEDOP

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 009/2022

Data início da obra: 01/07/2022

Data final da obra: 28/12/2023

Valor total da Obra: R\$ 261.973,12

Valor total aplicado: R\$ 134.365,81

Valor a desembolsar: R\$ 127.607,31

Percentual total aplicado: 51,29%

Percentual mensal aplicado: 30,53%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 79.988,61
