




# Relatório Mensal Execução de obras e serviços

---

**MÊS: OUTUBRO**  
**ANO: 2023**

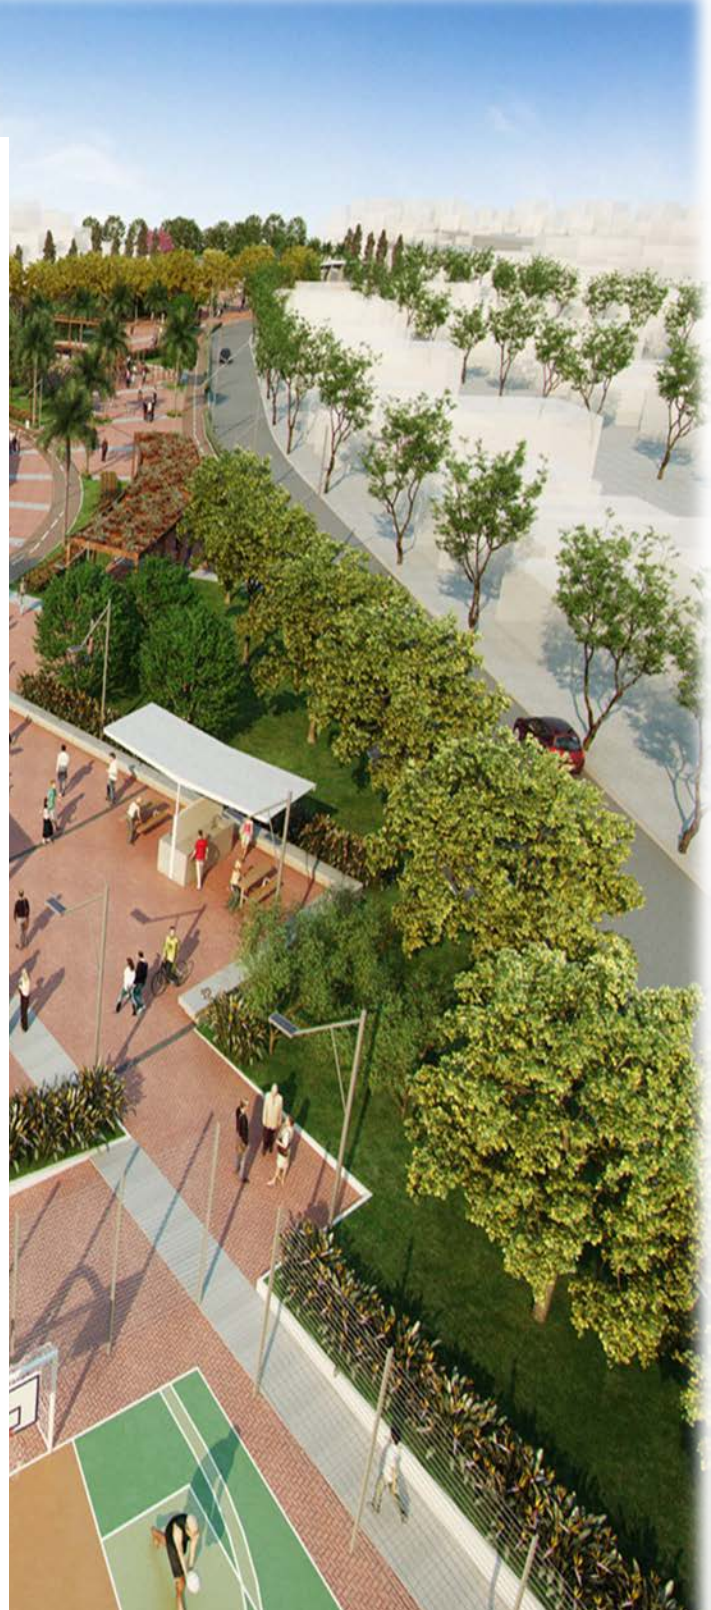

---

**Número de convênio:** 112/2022

**Objeto da obra:** CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

**Nome do contratado:** SOLLOS CONSTRUTORA LTDA – EPP

**CNPJ do contratado:** 01.733.027/0001-56

**Local da Execução da obra:** Travessa Antônio Gomes s/n

**Origem do Recurso:** SEDOP

**Modalidade da licitação:** TOMADA DE PREÇOS

**Número do Processo Licitatório:** 009/2022

**Data início da obra:** 01/07/2022

**Data final da obra:** 28/12/2023

**Valor total da Obra:** R\$ 261.973,12

**Valor total aplicado:** R\$ 155.473,24

**Valor a desembolsar:** R\$ 106.499,88

**Percentual total aplicado:** 59,35%

**Percentual mensal aplicado:** 8,06%

**Valor aplicado no mês Vigente:** R\$ 21.107,45

**Transferências recebidas:** R\$ 0,0

**Transferências realizadas:** R\$ 21.107,45

---

**Número de convênio:** 297/2022

**Objeto da obra:** CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA FEIRA DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

**Nome do contratado:** Sem licitação

**CNPJ do contratado:** Sem licitação

**Local da Execução da obra:** Rodovia Transamazônica km 240

**Origem do Recurso:** SEDOP

**Modalidade da licitação:** Sem licitação

**Número do Processo Licitatório:** Sem licitação

**Data início da obra:** 01/07/2022

**Data final da obra:** 01/07/2023

**Valor total da Obra:** R\$ 329.334,53

**Valor total aplicado:** R\$ 251.726,40

**Valor a desembolsar:** R\$ 77.608,13

**Percentual total aplicado:** 76,43%

**Percentual mensal aplicado:** 76,43%

**Valor aplicado no mês Vigente:** R\$ 251.726,40

**Transferências recebidas:** R\$ 251.726,40

**Transferências realizadas:** R\$ 251.726,40
