




Relatório Mensal Execução de obras e serviços

MÊS: MARÇO
ANO: 2023

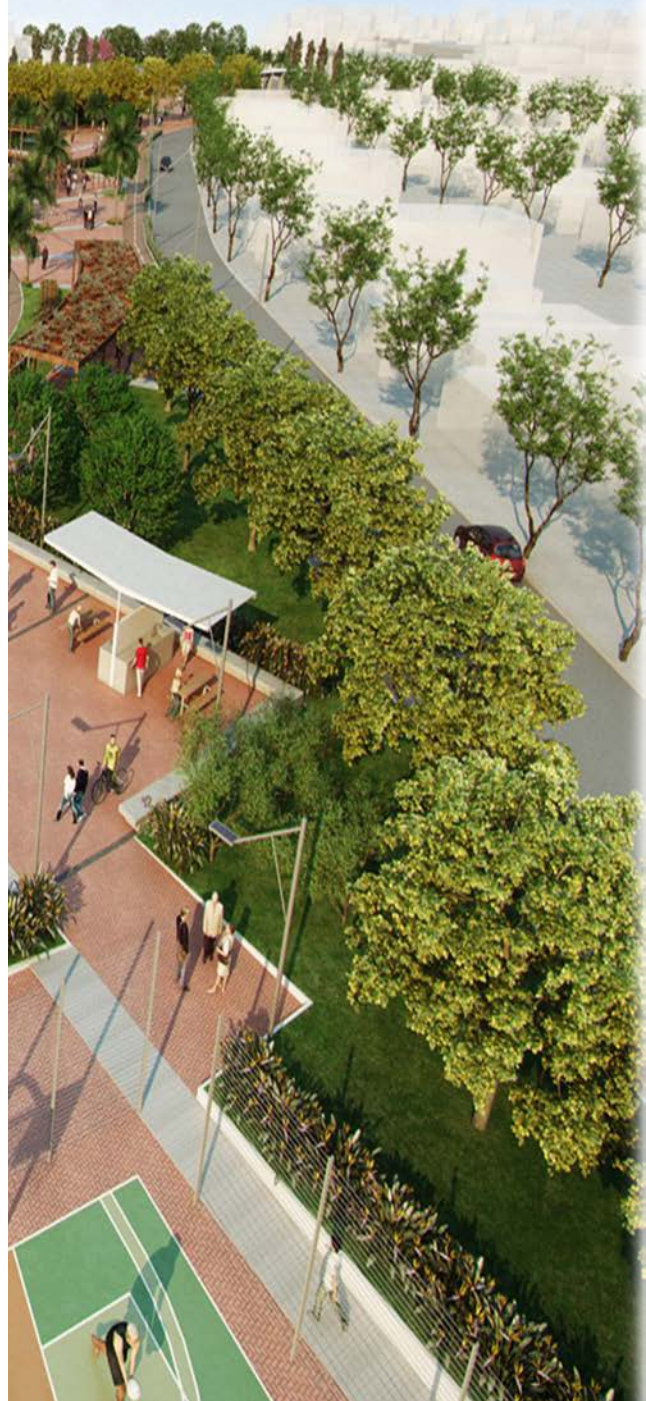

Número de convênio: 005/2022

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

Nome do contratado: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ do contratado: 36.908.164/0001-69

Local da Execução da obra: Rua Nossa Senhora Aparecida S/N

Origem do Recurso: SEPLAD

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 005/2022

Data início da obra: 03/03/2022

Data final da obra: 27/06/2023

Valor total da Obra: R\$ 588.585,50

Valor total aplicado: R\$ 170.587,13

Valor a desembolsar: R\$ 417.998,37

Percentual total aplicado: 28,98%

Percentual mensal aplicado: 14,58%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 85.833,51
