




Relatório Mensal Execução de obras e serviços

MÊS: ABRIL
ANO: 2023

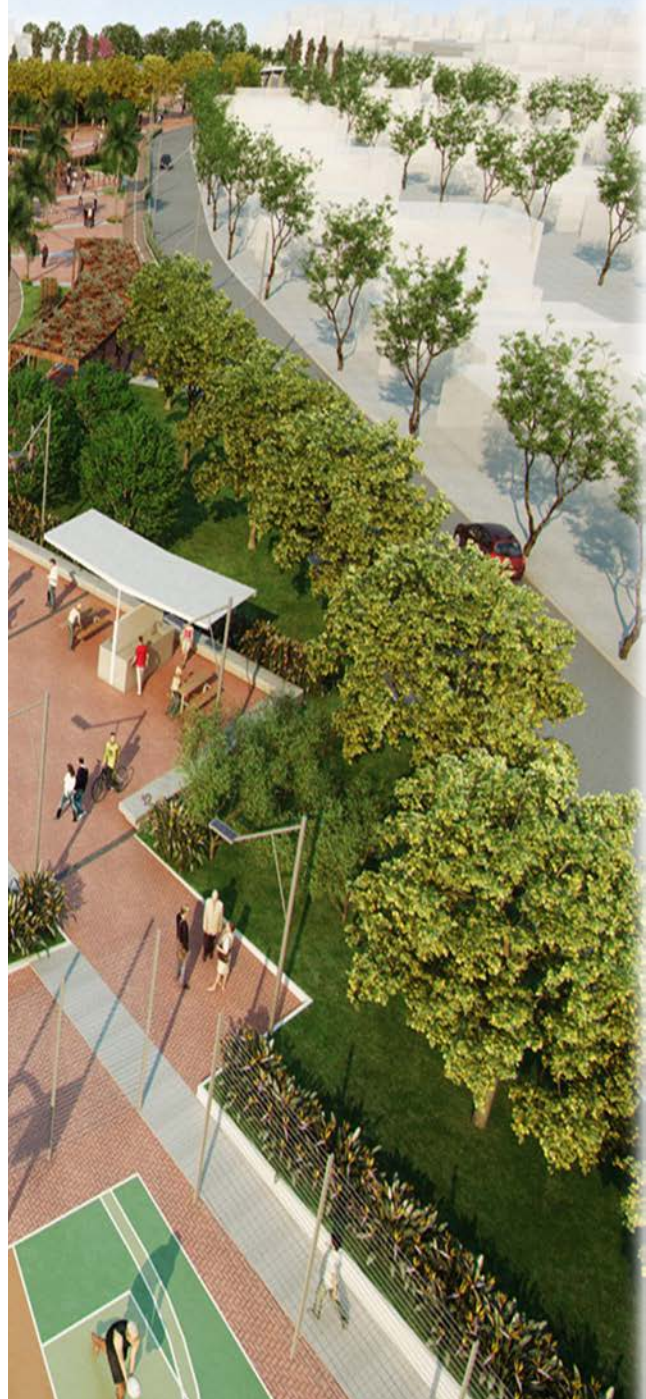

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Número do convênio: 850730/2017

Objeto da obra: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

Nome do contratado: W. R. P. MARQUES EIRELI

CNPJ do contratado: 22.814.959/0001-01

Local da Execução da obra: Rodovia Transamazonica

Origem do Recurso: MINISTÉRIO DOS ESPORTES

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 009-2021 Tomada de preços

Data início da obra: 08/08/2018

Data final da obra: 23/08/2023

Valor total da Obra: R\$ 119.270,22

Valor total aplicado: R\$ 119.270,22

Valor a desembolsar: R\$ 0,0

Percentual total aplicado: 100%

Percentual mensal aplicado: 43,25%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 53.940,65

Número de convênio: 915389/2021

Objeto da obra: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA.

Nome do contratado: E. C. G. Lima Eirelli

CNPJ do contratado: 38.235.887/0001-70

Local da Execução da obra: Ramal do Lama / Ramal do Nonato

Origem do Recurso: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Modalidade da licitação: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 006/2022

Data início da obra: 29/12/2021

Data final da obra: 29/12/2025

Valor total da Obra: R\$ 3.761.745,00

Valor total aplicado: R\$ 1.646.607,88

Valor a desembolsar: R\$ 2.115.137,12

Percentual total aplicado: 43,77%

Percentual mensal aplicado: 43,77%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 1.646.607,88

Número de convênio: 005/2022

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA JOVENS NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

Nome do contratado: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ do contratado: 36.908.164/0001-69

Local da Execução da obra: Rua Nossa Senhora Aparecida S/N

Origem do Recurso: SEPLAD

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 005/2022

Data início da obra: 03/03/2022

Data final da obra: 27/06/2023

Valor total da Obra: R\$ 588.585,50

Valor total aplicado: R\$ 170.587,13

Valor a desembolsar: R\$ 417.998,37

Percentual total aplicado: 28,98%

Percentual mensal aplicado: 14,58%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 85.833,51
