OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

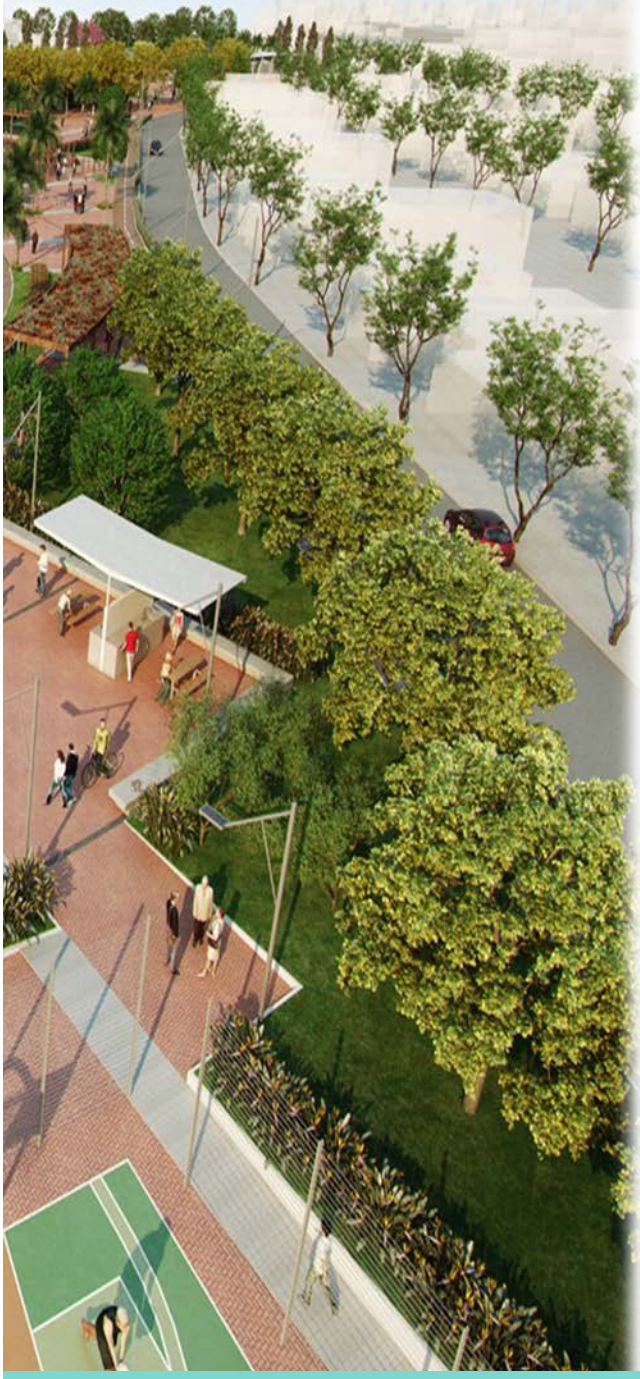

Relatório Mensal

Execução de obras e serviços

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2022

Objeto da obra: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE PLACAS-PA

Nome do contratado: MACOM SERVICOS & LOCACOES

CNPJ do contratado: 36.908.164/0001-69

Local da Execução da obra: Bairro Boa Esperança

Origem do Recurso: MS/FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Modalidade da licitação:TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 004/2021 – Tomada de preços

Data início da obra: 29/12/2017

Data final da obra: 26/12/2022

Valor total da Obra: R$ 218.683,90 (2° contrato)

Valor total aplicado: R$ 53.542,85

Valor a desembolsar:R$ 93.699,98

Percentual total aplicado: R$ 57,71%

Percentual mensal aplicado: 24,48%

Valor aplicado no mês Vigente:R$ 53.542,85
